

产品需求文档

示例产品

版本：1.0 · 2026-10-08

目录

产品定义	4
是什么	4
目标用户	4
核心问题	4
价值	4
产品形态	4
角色	4
产品原则	4
Product 1.0	6
版本历史	6
1. 需求概述	6
产品背景	6
本版目标	6
价值点	6
涉及系统	6
风险说明	7
2. 产品描述	7
名词解释	7
整体流程	7
功能清单	8
3. 功能需求	8
3.1 订单管理	8

3.2 经营看板	10
4. 非功能需求	13
权限与可见性	13
数据留存	13
统计与埋点	13
安全底线	13
5. Non-goals	13
6. 成功标准 / Release Criteria	13
7. 未解决问题	13
Scope	15
In Scope	15
Later	15
Out of Scope	15

产品定义

是什么

一个面向中小制造企业的采购订单协同系统，把散在微信、邮件和线下单据里的采购流程收进一处。

目标用户

有固定供应商、每月采购单量在三百到八百之间的制造企业，采购与审批由不同的人负责。

核心问题

订单状态靠人问：采购岗不知道审批到哪一步，审批岗不知道哪些单等着自己，财务不知道这个月付了多少。催单靠微信，出错靠事后对账。

价值

订单状态一处可查，待办自动到人，经营数据当天可见。

产品形态

- 形态：后台管理系统
- 移动端适配：否

角色

角色	职责	可操作范围
采购岗	创建、提交、跟踪采购订单	自己创建的订单，可查看全部订单状态
审批岗	审批与批量作废订单，查看经营看板	全部订单，含金额与供应商明细

产品原则

- 状态变更必须留痕，谁在什么时候改了什么都能查

- 不可逆操作一律二次确认，并列清受影响的单据
 - 看板只呈现已有数据，宁可显示空态也不显示 0 冒充
-

Product 1.0

版本历史

版本	日期	变更内容	修订人
1.0	2026-09-22	初版，定义订单管理、批量操作、经营看板三块能力	Charles

1. 需求概述

产品背景

当前采购订单用 Excel 维护，审批走微信截图。过去半年出现三次重复下单，单次金额在八万到十九万之间，均因采购岗不知道同事已经下过同一张单。

本版目标

上线三个月内，采购与审批全程在系统内完成，订单状态不再需要人工询问，审批岗每天进系统就能看到自己的待办。

价值点

把"重复下单"从每半年三次降到零，把"审批到哪一步"从平均两次询问降到零次。按单次八万计，一次重复下单的损失就超过系统半年的投入。

涉及系统

系统	对接内容	对接方
供应商主数据	读取供应商名称、结算方式与信用额度	ERP 团队，1.0 先做单向读取
财务系统	写入已审批订单的应付信息	财务团队，1.0 按日批量推送
站内通知	发送待办与结果通知	系统内置，不接第三方

风险说明


风险	影响	应对
供应商主数据在 ERP 里不全，部分供应商没有结算方式	订单创建时字段缺失	允许手工补录并标记为待核实，不阻断下单
财务系统的接口档期晚于本版上线	应付信息无法自动写入	1.0 先提供导出，接口就绪后切换为自动推送

2. 产品描述

名词解释

名词	定义	取值范围	定义来源
采购订单	一次采购行为的完整记录，含供应商、明细与金额	--	本文档
订单状态	订单当前所处的流转阶段	1 待审批 / 2 处理中 / 3 已完成 / 4 已驳回 / 5 已作废	本文档
作废	终止一张尚未完成的订单，不可恢复	--	本文档
延期风险订单	预计交期晚于约定交期的订单	--	本文档

整体流程

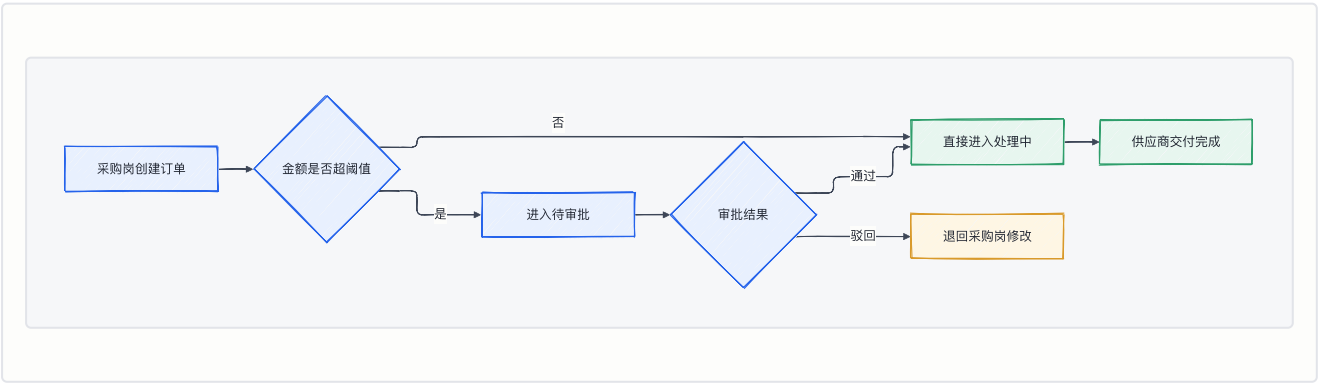

图注：绿色为顺利路径，黄色为退回路径，蓝色为需要人工判断的环节。

功能清单

模块	功能	优先级	说明
订单管理	订单列表与筛选	P0	三个筛选条件，按创建日期倒序
订单管理	订单创建与提交	P0	必填六个字段，超阈值自动进审批
订单管理	批量作废	P0	仅审批岗可用，二次确认后逐条提交
经营看板	指标卡与趋势图	P0	四个指标可下钻，至少一张趋势图

3. 功能需求

3.1 订单管理

场景描述

采购岗每天创建若干张订单并跟踪状态；审批岗每天进系统处理待办，对已经不需要的订单批量作废。


需求条目

- **REQ-1.0-001** 订单列表支持按订单号前缀、状态、创建日期筛选，三个条件之间是且的关系
- **REQ-1.0-002** 支持创建订单，必填字段为供应商、金额、币种、约定交期、采购明细与备注
- **REQ-1.0-003** 审批岗可批量作废订单，作废前二次确认并列出受影响的单号与金额合计，作废后不可恢复
- **REQ-1.0-004** 已失效：原计划支持订单模板一键复制，改为 2.0 的 **REQ-2.0-002**

字段定义

字段	类型	必填	约束	默认值	说明
orderId	BIGINT	是	主键，应用层生成的分布式 ID	无	订单唯一标识
orderNo	VARCHAR(24)	是	唯一，格式 PO-yyyyMMdd-三位序号	无	订单号，展示与检索用
supplierId	BIGINT	是	外键，指向供应商主数据	无	供应商标识
amount	DECIMAL(12,2)	是	大于 0	无	订单总金额，单位元
currency	VARCHAR(3)	是	遵循 ISO 4217	CNY	币种代码
promisedDate	DATE	是	不早于创建日期	无	约定交期
status	TINYINT	是	1 待审批 / 2 处理中 / 3 已完成 / 4 已驳回 / 5 已作废	1	订单状态
createdBy	BIGINT	是	外键，指向用户表	无	创建人
createdAt	DATETIME	是	系统写入，不可修改	无	创建时间

流程

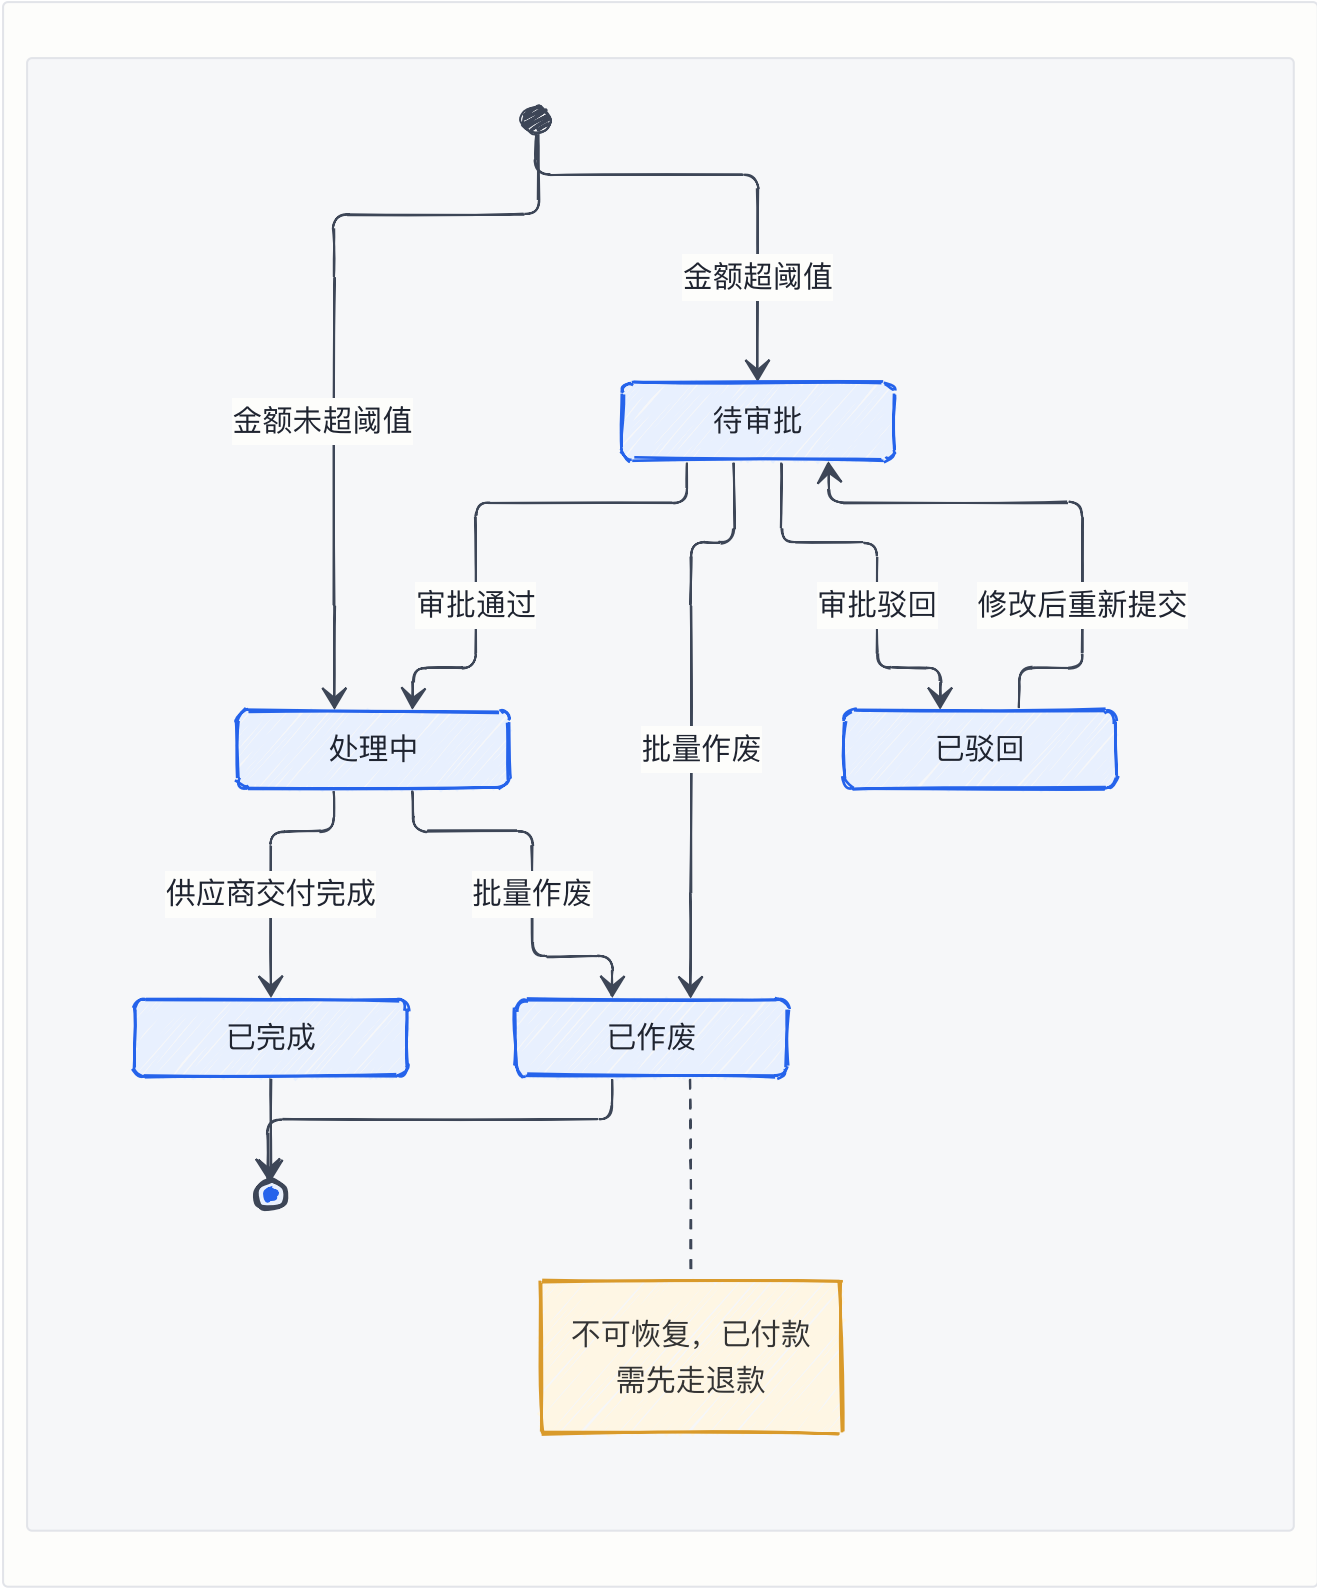


3.2 经营看板

场景描述

审批岗每天早上看一眼看板，确认本月订单量、待审批积压与延期风险，异常的指标点进去看明细。

需求条目

- **REQ-1.0-020** 看板展示本月订单数、待审批数、延期风险订单数与本月已付款金额，每个指标可下钻到对应明细
- **REQ-1.0-021** 看板至少提供一张趋势图，指标接口不可用时显示缓存快照并标注数据截止时间，不显示0

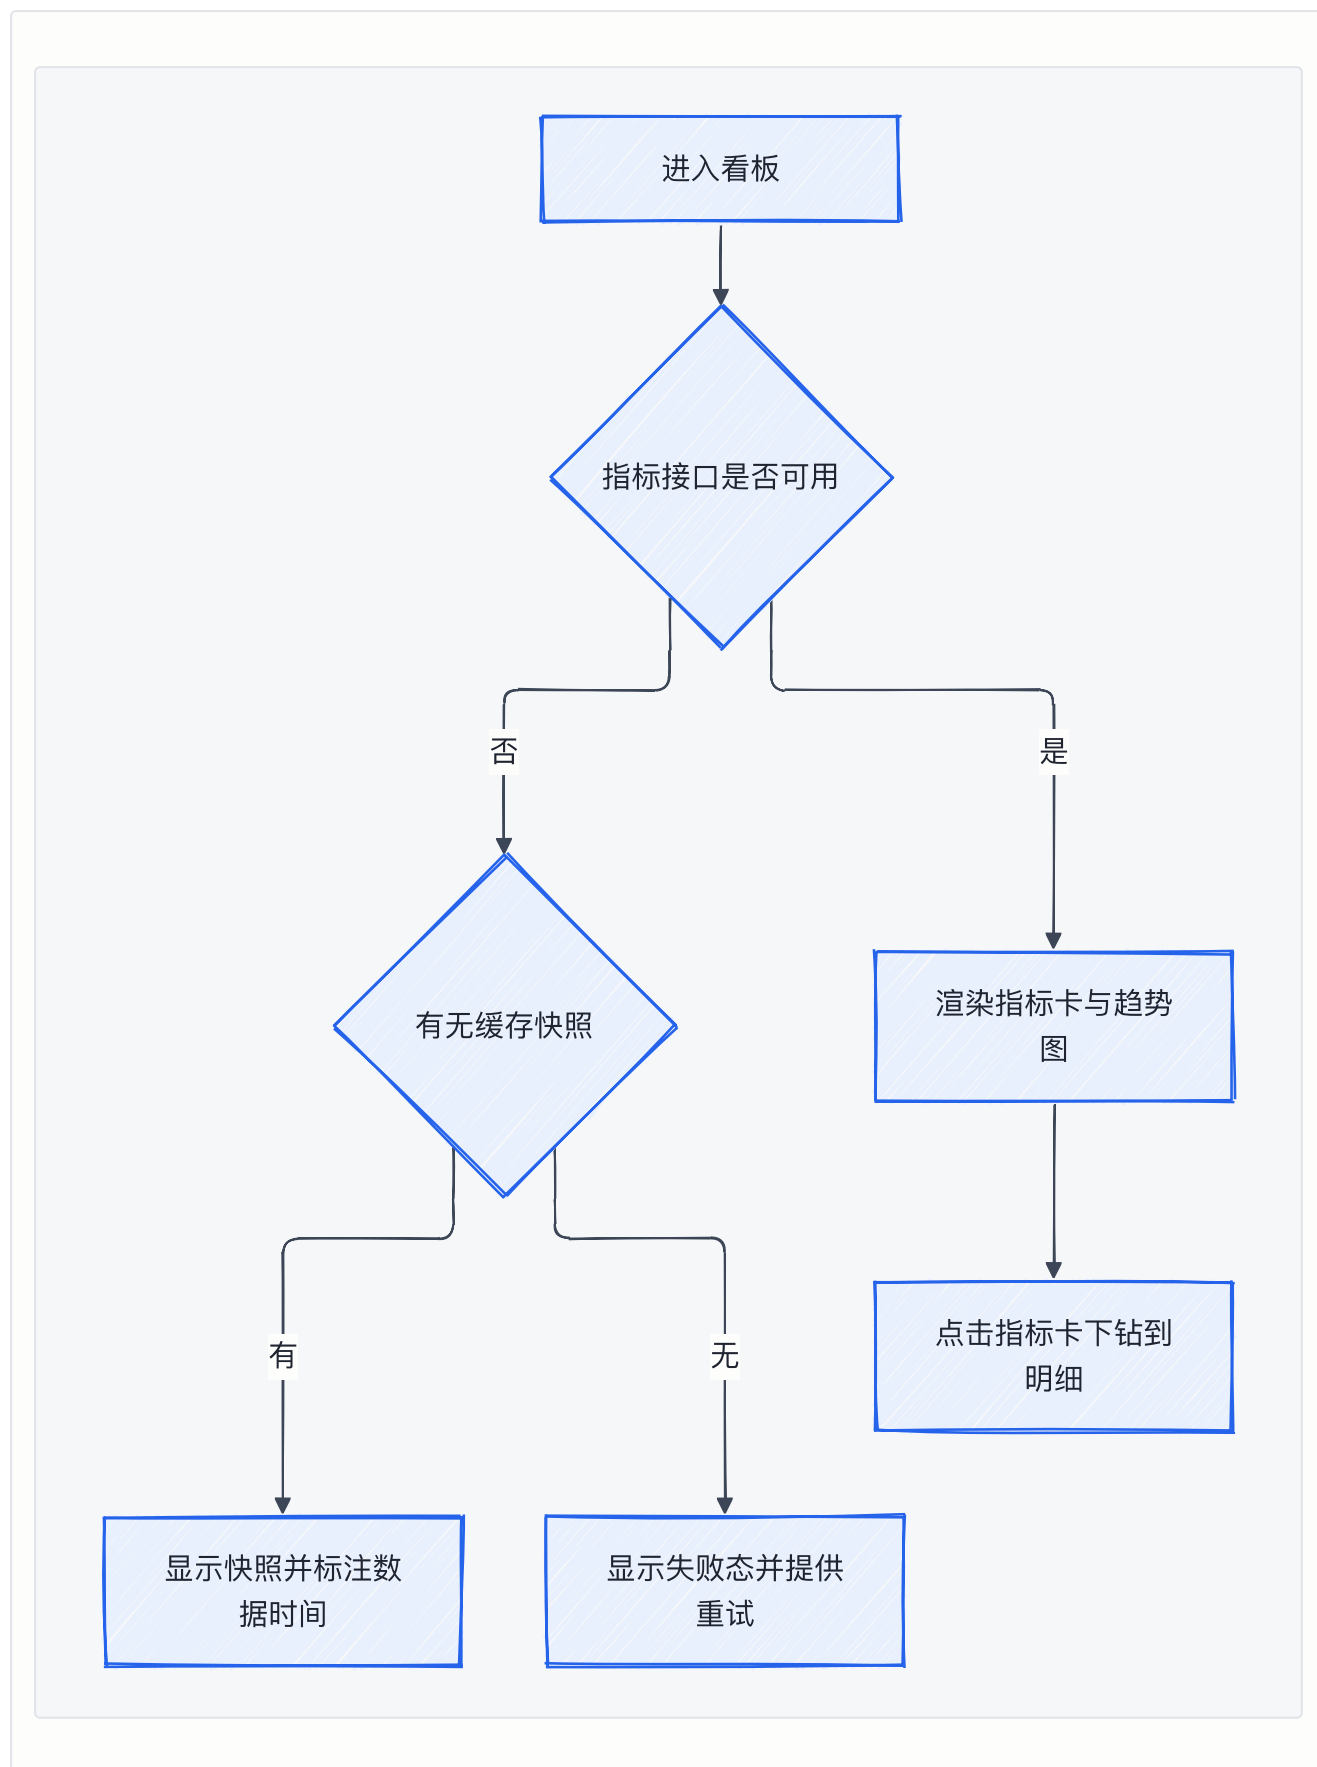

4. 非功能需求

权限与可见性

两个角色。采购岗只能修改自己创建的订单，可查看全部订单的状态但看不到其他人订单的金额明细；审批岗可见全部订单与经营看板。

数据留存

订单与状态变更记录永久保留，已作废订单不物理删除。导出文件保留 30 天后自动清理。

统计与埋点

记录三类行为以回答“审批是否及时”：待办生成时间、审批岗首次打开时间、审批完成时间。不记录供应商名称与金额用于统计。

安全底线

金额与供应商明细按角色隔离，接口层校验不依赖前端隐藏。日志与导出文件中不出现供应商联系人信息。批量作废记录操作人与时间，不可编辑。

5. Non-goals

- 不做供应商主数据的维护，只读取 ERP 的数据
- 不做付款与对账，只把应付信息推给财务系统
- 不做移动端，1.0 只覆盖桌面浏览器

6. 成功标准 / Release Criteria

- 采购岗能在三分钟内完成首次下单并在列表中看到该订单
- 审批岗进入系统后不需要额外筛选就能看到自己的全部待办
- 批量作废在部分失败时保留失败清单，操作人能直接重试
- 指标接口不可用时看板显示缓存快照与数据时间，不显示 0

7. 未解决问题

1. **审批阈值由谁配置**：目前写死为单笔十万，是否需要按供应商或品类分别设置，取决于首批客户的实际管理方式，影响 [REQ-1.0-002](#) 的字段设计

2. **延期风险的判定口径**：预计交期来自供应商填报还是系统推算尚未确定，影响 **REQ-1.0-020** 的指标含义与看板下钻的数据源
-

Scope

In Scope

- 订单列表、筛选与分页
- 订单创建、提交与审批
- 批量作废与批量导出
- 经营看板与指标下钻

Later

- 订单模板一键复制，见 [REQ-2.0-002](#)
- 移动端待办处理
- 与财务系统的实时接口

Out of Scope

这一节比 In Scope 更重要，它是后面拒绝范围蔓延的依据。

- 供应商主数据维护：数据源在 ERP，两处维护必然不一致
- 付款与对账：财务系统已有成熟流程，重做没有收益
- 移动端：审批岗的实际工作场景在办公室，1.0 不投入
